

Nomor : 09/LPP-DDPDRSP-LSF/AMK/V/2024

Jakarta, 13 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Pengadaan Pemasangan Dinding Dan Peredam Dinding Ruang Studio Penyensoran.

Kepada Yth ;

Pejabat Pembuat Komitmen

Lembaga Sensor Film

Di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Dinding Dan Peredam Dinding Ruang Studio Penyensoran yang dilaksanakan pada bulan April Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kami dari PT. AFTHAR MUDA KARYA melakukan Pekerjaan Pengadaan Pemasangan Dinding Dan Peredam Dinding Studio Penyensoran.
2. Pekerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata ruang studio sensor sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas penyensoran Lembaga Sensor Film.

Detail Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Dinding Dan Peredam Dinding Studio Penyensoran di Lantai 6 Lembaga Sensor Film dilakukan secara bertahap yaitu ;

1. Proses Persiapan dan Pemindahan Peralatan Kantor Dari Area Pelaksanaan Pekerjaan

Tahap awal pekerjaan dimulai dengan memindahkan dan merapikan peralatan kantor dari area pelaksanaan pekerjaan ke tempat lain untuk menghindari kerusakan barang dan terganggu proses jalannya pekerjaan.

2. Pekerjaan Pemasangan Rangka Dinding

Rangka dinding dengan menggunakan Metal Stud & U Runner Vertikal dan Horizontal yang dikerjakan seluas 144m² dengan dua lapis pekerjaan rangka dinding Metal Stud & U Runner Vertikal dan Horizontal pada lokasi pekerjaan.

3. Pekerjaan Pemasangan Rockwool 100kg/m³

Rockwool 100kg/m³ dengan tebal 5cm yang dikerjakan seluas 144m² dengan dua lapis pekerjaan Rockwool 100kg/m³ untuk meminimalisir terjadinya kebocoran suara pada dinding peredam.

4. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sheet

Karet Rubber Sheet dengan ketebalan 6mm di kerjakan seluas 144m² dengan dua lapis pekerjaan pada dinding perendam.

5. Pekerjaan Pemasangan GRC Board

Pekerjaan GRC Board dengan tebal 9mm yang dikerjakan seluas 144m² dengan dua lapis pekerjaan.

6. Pekerjaan Interior Dan Akustik Dinding

Pekerjaan interior dan akustik dinding ini menggunakan lapisan bahan Padded Wall Panel, Backing Multiplek 4mm, Multiplek Bevel 9mm, Foam 2cm dan Fin Fabric Ex Hennesy/Setara. Dikerjakan seluas 144m² sebagai lapisan peredam ketiga atau lapisan akhir pada pekerjaan dinding peredam studio penyensoran Lembaga sensor Film.

7. Pekerjaan Pengecetan Dinding

Pada bagian Akhir dilakukan pengecetan pada dinding bagian luar dan bagian dinding disekitar area studio yang terlihat kotor dengan cat putih.

8. Finishing Pekerjaan Dinding Studio

Membersihkan dan mensterilkan ruangan studio dari debu dan sisa-sisa bahan material pada bagian dalam dan luar ruangan studio penyensoran Lembaga Sensor Film.

PT. AFTHAR MUDA KARYA



ISKANDAR MUDA
Direktur Utama


DOKUMENTASI

PELAKSANAAN PEKERJAAN DINDING STUDIO PENYENSORAN LEMBAGA SENSOR FILM


Pelaksanaan Pekerjaan Pemindahan Barang Kantor





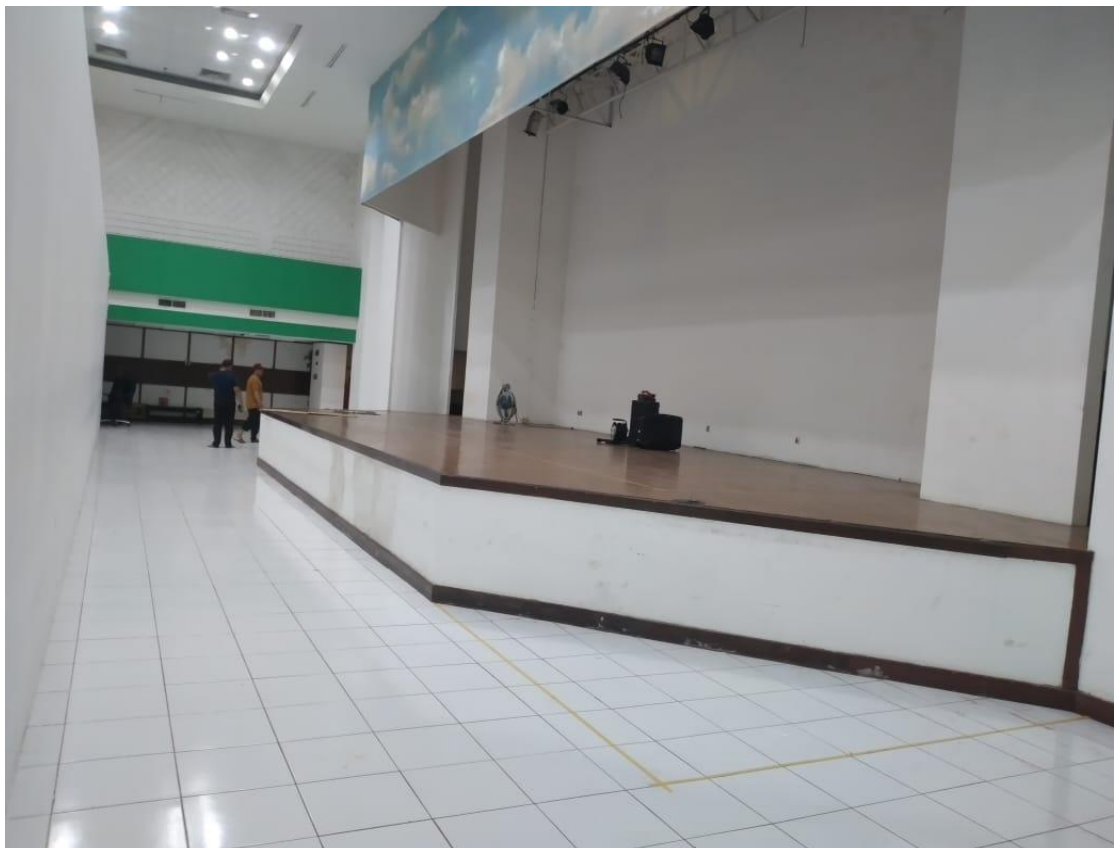

Pelaksanaan Pekerjaan Rangka Dinding

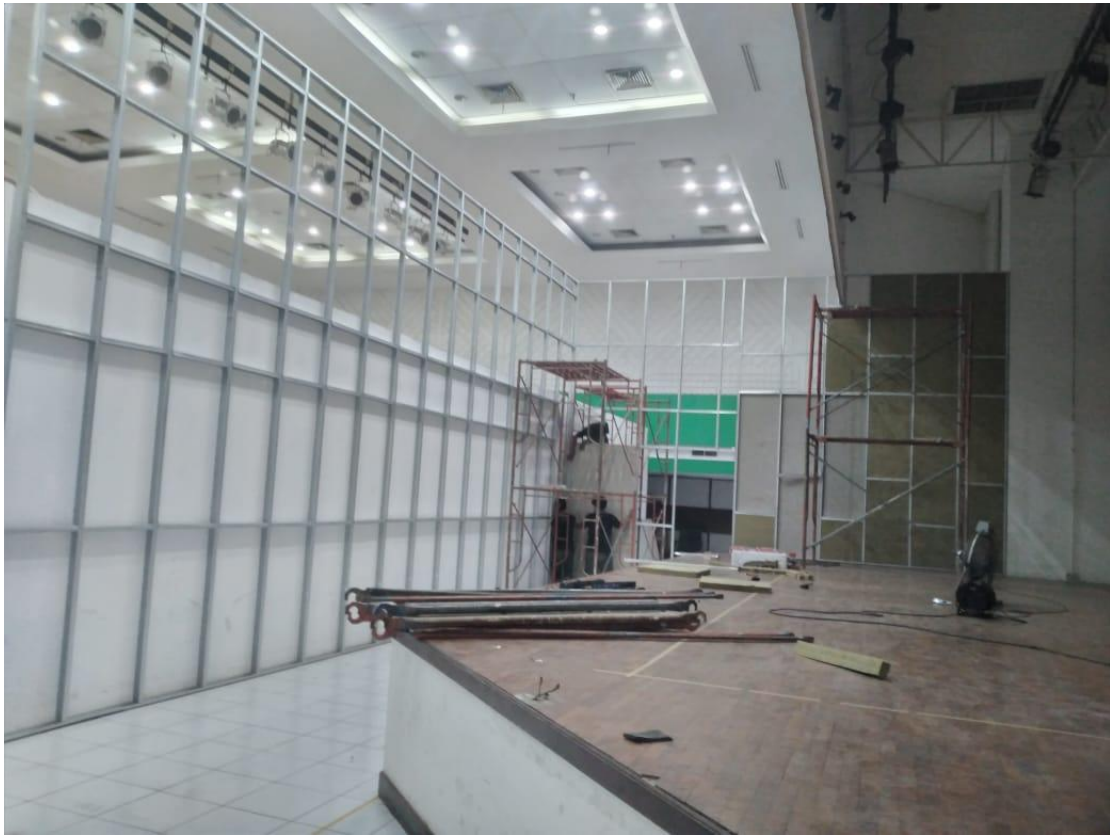



Pelaksanaan Pekerjaan Rockwool 100kg/m³





Pelaksanaan Pekerjaan Rubber Sheet





Pelaksanaan Pekerjaan GRC Board





PELAKSANA PEKERJAAN INTERIOR DAN AKUSTIK DINDING








Pelaksanaan Pekerjaan Pengecatan Dinding





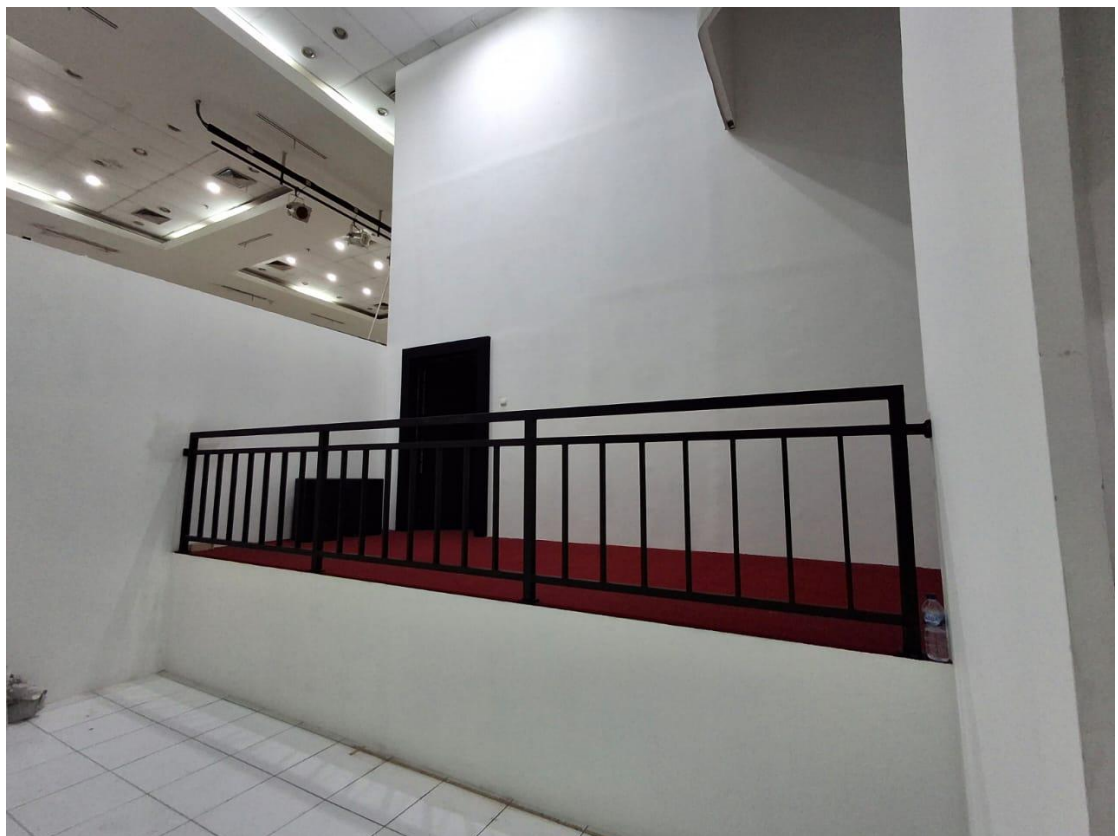

Pelaksanaan Finishing Pekerjaan Dinding Studio













